

# 案例名稱：協調中央大學解決綜合大樓工程流標問題

類型

國土永續  政府採購  公共建設  勞動政策  
 綜合行政  其他：\_\_\_\_\_

是否涉及跨部會協調


是：主政機關：\_\_\_\_\_ 涉及機關：\_\_\_\_\_

否

上傳本會網站  
 不上傳本會網站：  
 涉其他部會機關本位  
 尚在進行中  
 其他\_\_\_\_\_

項目	說明
案由	中央大學「教學研究綜合大樓新建工程」廠商因財務困難終止契約，工程自105年起停頓多年。
具體案情	<b>廠商財務困難終止契約，接續工程多次流標</b> 一、工程於99年6月28日土建與水電標同時開工，土建標廠商因財務問題於101年3月31日終止契約；第1次接續工程於102年3月9日開工，因廠商拒不施工，102年7月16日終止契約；第2次接續工程於103年9月23日開工，因廠商宣布破產，105年7月11日終止契約，工程全面停頓。 二、106年學校重新辦理第3次接續發包，流標4次均無廠商投標。
具體作法	<b>釐清建照期限、廠商保固責任及協調追加經費</b> 一、工程會吳主委107年8月20日現勘，釐清建照是否逾期、接續廠商保固責任範圍、土建與機電是否併標等關鍵因素後，並協調教育部追加經費。 二、經學校重新檢討後發包，工程於107年10月23日決標，107年11月22日開工，並於109年10月29日竣工。

\*相關照片或圖說

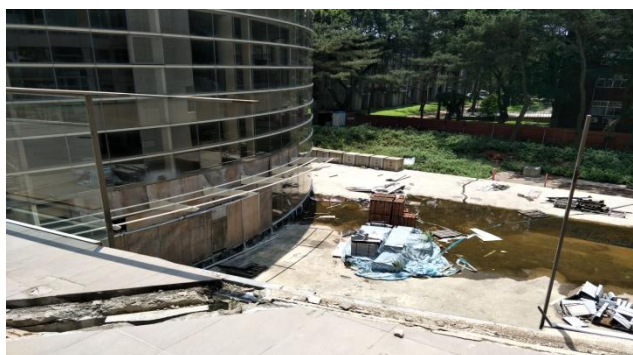

教學研究綜合大樓新建工程



教學研究綜合大樓新建工程

提報單位：工程管理處
