

如何正確提報災後復原重建

行政院公共工程委員會

108年8月6日

簡報大綱

- 壹、法規依據
- 貳、作業流程
- 參、歷年審議結果
- 肆、落實作法
- 伍、案例說明
- 陸、結語

壹、法規依據(1/3)

一、對地方政府公共設施復建經費的支援

(一)災害防救法第43-1條：

直轄市、縣（市）政府**無法支應重大天然災害**之災後復原重建等經費時，**得報請中央政府補助**。

壹、法規依據(2/3)

(二)中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第5條略以：

1. 各級地方政府動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年度預算，辦理各項災害救助、緊急搶救及復建等所需經費。
2. 尚不足支應重大天然災害所需經費時，就不足部分，報請中央政府主管機關或行政院協助。




壹、法規依據(3/3)

二、何謂天然災害？

災害防救法第2條第1款第1目：

風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等。

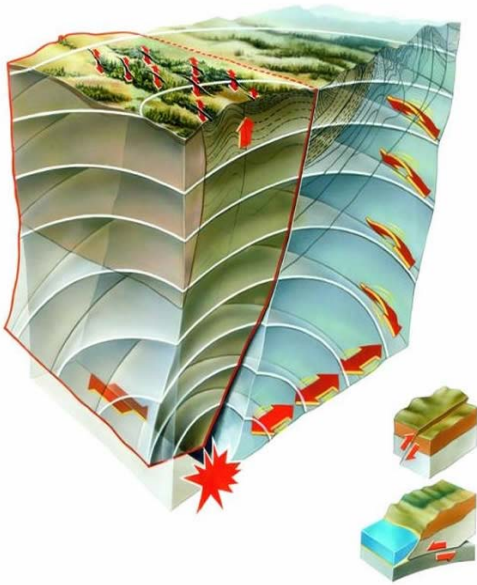

貳、作業流程

地方政府向**行政院**請求協助復建工程經費
公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

啟動

- 工程會發函啟動地方公共設施復建專案

提報

- 縣市政府1個月內**得分批**提報復建經費需求

審議

- 工程會及中央審議作業主管機關辦理**現勘**審查

核列

- 召開專案會議確認復建內容及所需經費

執行

- 確認後據以辦理規劃設計、發包施工

參、歷年審議結果

	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年
件數	1,319	11,807	104	144	5,373	5,311	2,205	3,558	6,820	5	2,249	617	5,109	4,175	324	1,253	2,813	1,722	1,432
\$:億	27.7	255	0.9	1.3	111.7	75.0	50.7	60.5	132.6	0.63	47.3	12.3	109.7	69	3.6	34.59	53.7	36.9	41.3

總件數：56,340件；總經費：1,124億元



平均每年2,965件！
 經費59.18億元！

98年莫拉克颱風由特別預算支應，未列入統計平均。

肆、落實作法(1/2)

一、善用資訊系統，提升行政效率

行政院公共工程委員會
 災後復建工程經費審議及執行資訊系統

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：222905

徐華喲，歡迎。登出



最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建

請選擇颱風：101年6月泰利颱風

篩選條件

工程類別：全部 復建經費：全部

機關名稱：南投縣政府 鄉(鎮市)：全部 狀態：全部 篩選

工程名稱： 執行狀態：全部

經審議後建議變更類別之案件


執行狀態顏色說明：未送出 申請中 退回 已核可

<https://recovery.pcc.gov.tw/>

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
南投縣政府	A1	001	埔里鎮史港坑排水護岸復建工程	埔里鎮	廣成里	1,231		已完工
南投縣政府	A1	002	埔里鎮柑杷城排水奇英橋下游護岸復建工程	埔里鎮	清新里	6,520	完工期限展延	未完工
南投縣政府	A1	003	埔里鎮綠米里綠米坑排水護岸復建工程	埔里鎮	綠米里	1,935	完工期限展延	逾期未


肆、落實作法(2/2)

二、落實各階段作業，加速復原重建

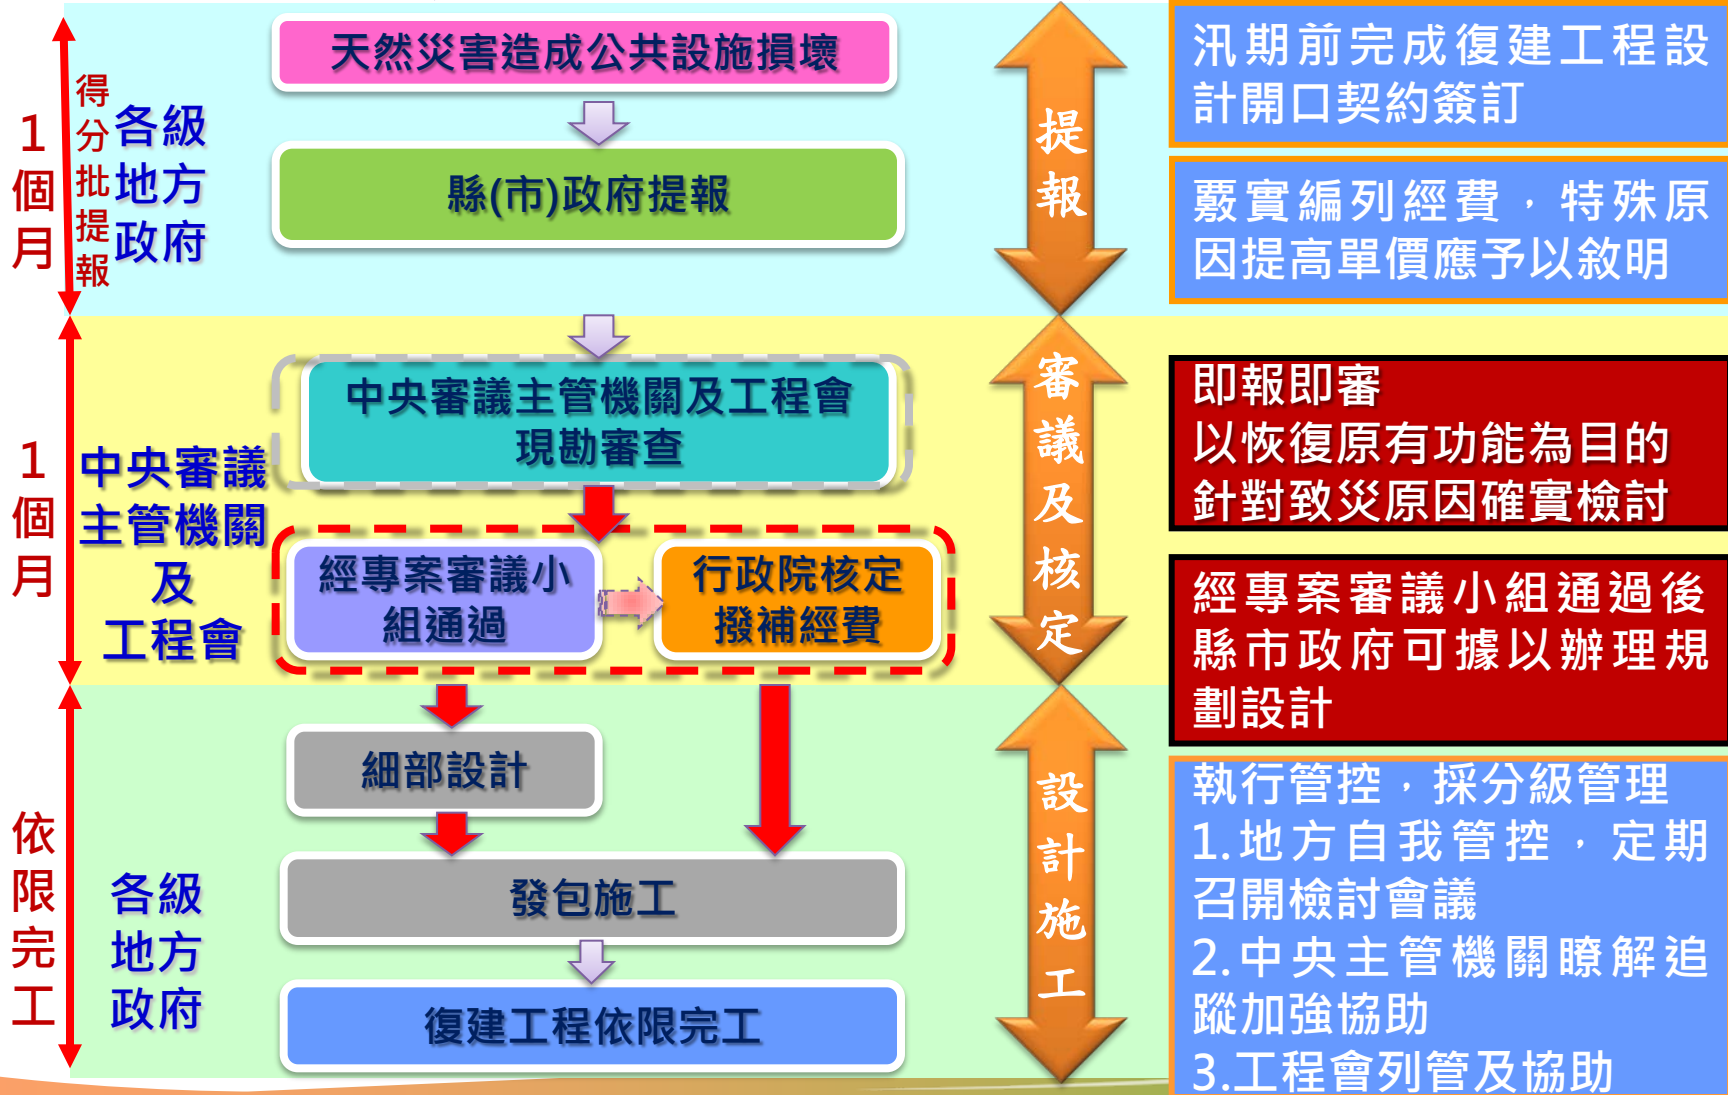

伍、案例說明(1/3)

一、大規模崩塌災區先核定規劃費，再續核定復建經費。

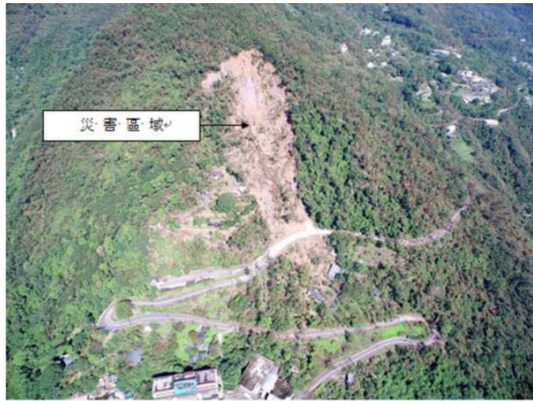

104年8月蘇迪勒颱風某縣市提報道路復建工程約1.73億元

(一)因崩塌面積甚廣，先核列180萬元辦理地質調查及鑽探等可行性研究及規劃工作，以評估出最佳復建方案。另核列784萬元辦理崩坍坡面簡易水保先採便道恢復通行。

(二)縣府105年9月提出復建工程方案，同意再另增加8,057萬餘元。



伍、案例說明(2/3)

二、災情未能於短期內全盤掌握者，先核定調查費，再續核定復建經費。

107年0206地震某縣政府提報污水下水道管線災後復建工程7億元

(一)因災區範圍大、管線長度長、設備不足等因素先核列：

1. 災損明確之450m立即修復，經費900萬元。
2. 辦理長度70公里地下管線TV檢測，經費3,150萬元，瞭解實際損壞情形。

(二)縣府107年12月完成TV檢測報告，因無受損，無須再增列復建經費。



伍、案例說明(3/3)

三、恢復原有功能為目的，非原地原狀復建



106年6月豪雨某縣山區道路災修工程，災損路段長約85公尺，因坍方落石嚴重，核定4,253萬元改採200公尺明隧道辦理。

陸、結語

一、復建工程目的：盡速恢復原有功能，避免重複致災

二、復建工程提報

- ✓ 掌握提報時效
- ✓ 瞭解周遭環境
- ✓ 找出致災原因
- ✓ 提出合宜工法
- ✓ 覈實編列經費



簡報完畢
